

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 134/2026/80773/C01:1

DATE DU CONTRÔLE 25/08/2026

AGENT VISITEUR

Steve Debout

ADRESSE DU CONTRÔLE

Avenue François Deladrière 2 -
7181 Seneffe

AGRÈMENT RÉGION WALLONNE

AGRW. DEP-048/A/10 expire le
05/02/2029



COORDONNÉES DE L'EXPLOITANT DE LA CITERN^e

Propriétaire

#TVA

non communiqué

Adresse

Avenue François Deladrière 2 - 7181 Seneffe

SITUATION DU RÉSERVOIR ET DE SES ACCESSOIRES

Plan d'implantation

Non

Situation du réservoir

A droite maison

Localisation du dépôtage

Devant maison

RÉSERVOIR

Autorisation d'exploitation	Oui	Date d'émission, échéance & numéro	18/08/2026 - 18/08/2036
Capacité autorisée et/ou réelle (litres)	Inconnu	Année d'installation	Inconnu
Origine du réservoir et n° de fabrication	Inconnu	Certificat d'étanchéité antérieur	Non
Dimensions du réservoir	Diamètre 130cm		
Type de réservoir	Cylindrique - Enterré - Simple paroi - Métallique		

CONTRÔLE

Système de chauffage	Chaudière	Fonctionnement du système de chauffage	Fonctionne
Type de raccordement au système de chauffage	Bi-tube	Contrôle des tuyauteries visibles du réservoir au système de chauffage	Conforme
Soutirage	Par le haut - Conforme	Conduite de remplissage	Conforme
Conduite de ventilation	Pas Conforme	Système anti-débordement	absent
Système de mesure de niveau	pas présent	Trou d'homme	Conforme
Pollution en dehors du réservoir	Non		

TEST DE DÉPRESSION

Hauteur de produit avant le test (cm)	97	Hauteur d'eau avant le test (cm)	0
Étanchéité de la chaîne de mesure avant contrôle	OK	Résultat de l'épreuve d'étanchéité	Conforme aux prescriptions imposées par l'état
Durée de la mise sous pression	60	Hauteur de produit après test (cm)	97
Hauteur d'eau après le test (cm)	0	Dépression atteinte (mbar)	-246
Valeur de la dépression à T0 (mbar)	-246	Valeur de la dépression à T10 (mbar)	-240
Valeur de la dépression à T50 (mbar)	-240	Valeur de la dépression à T60 (mbar)	-240

Appareil TESTO 312-3 référencé « 3131690 » et vérifié le 06/10/2025 selon nos procédures internes.

AUTRE(S) REMARQUE(S)

Placer un système anti-débordement : sifflet ou sonde

Il faut rendre le système anti-débordement démontable afin de pouvoir vérifier la longueur de la tige

Le diamètre de l'évent est insuffisant ; il doit faire minimum 5/4"

Absence de bouchon sur un raccord sur le plateau trou d'homme, risque d'infiltration d'eau dans la cuve

Conclusion : L'étanchéité est assurée mais pas la conformité. Il faut y remédier dans les 6 mois.
Le réservoir ne peut être rempli que pendant ces 6 mois, non renouvelable, prenant cours le mois du contrôle.



Une plaquette orange a été fixée et scellée sur la conduite de remplissage du réservoir le jour même du contrôle.

Le réservoir a fait l'objet d'un contrôle conformément aux prescriptions de :

- 30 novembre 2000 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Titre III du règlement général pour la protection du travail en ce qui concerne les contrôles des dépôts de liquides inflammables et l'implantation et l'exploitation des stations - service (M.B. 17.01.2001)
- 8 mai 2003 - Arrêté ministériel dérogeant aux dispositions de l'article 590 du titre III du RGPT portant sur le contrôle d'étanchéité des dépôts de liquides inflammables en insérant une nouvelle technique de contrôle: le test en dépression (M.B. 19.03.2004)
- 17 juillet 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations - service
- 24 juillet 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon du modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations - service.

Fait à : Seneffe

Signature du technicien

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 134/2026/80773/C01:1

› ANNEXES

Système de chauffage



Listing test d'étanchéité de la chaîne de mesure avant contrôle



CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 134/2026/80773/C01:1

ANNEXES

Listing test d'étanchéité du réservoir



CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL


RÉF. 134/2026/80773/C01:1

› ANNEXES

Listing test d'étanchéité du réservoir



Autorisation d'exploitation

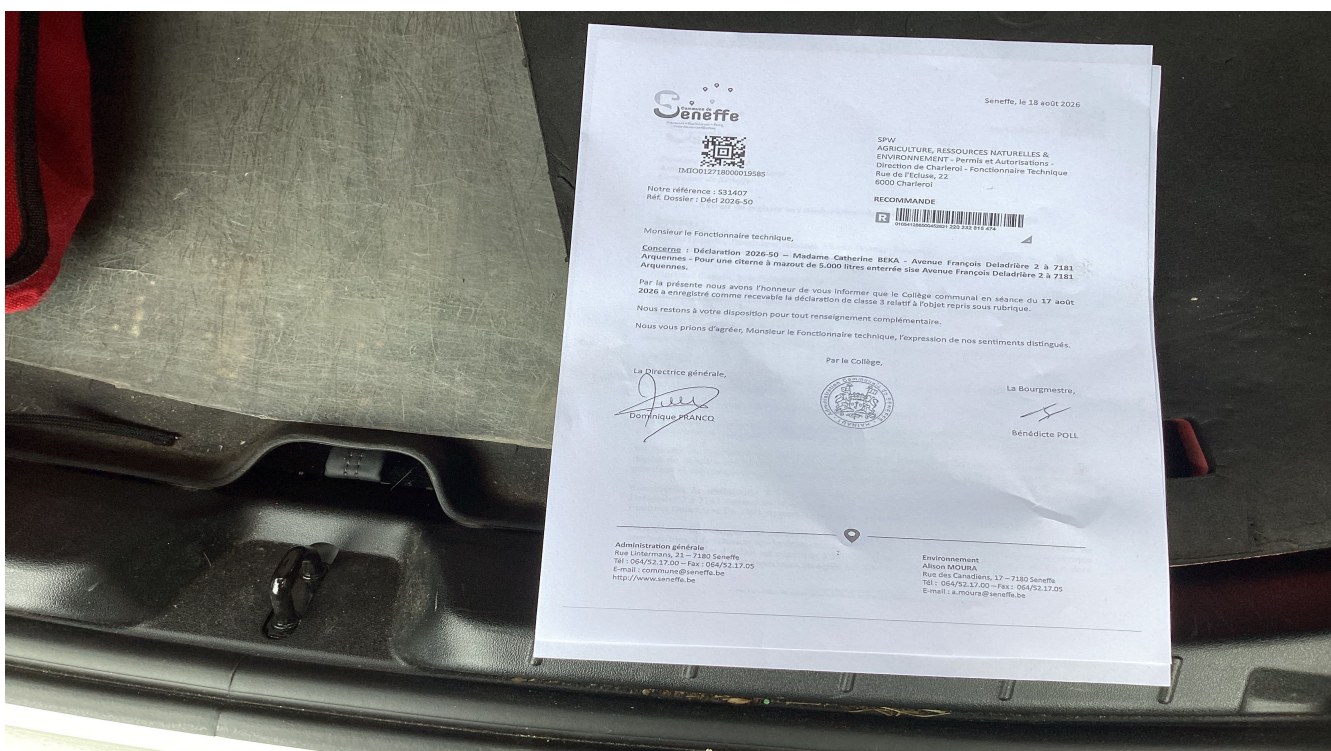

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 134/2026/80773/C01:1

› ANNEXES

Chambre de visite et accessoires



CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 134/2026/80773/C01:1

› ANNEXES

Plaquette apposée sur le réservoir

